

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO nr 2

Inwestor ZBK

Obiekt realizowany i nr zlec.: TT.10-422-38/11/15 (TT.10/10232/15) 33626/TT/VIII/15

FORT 2 KOŚCIUSZKO – KURTYNA I

Wykonujący nadzór : mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

Data wykonanie nadzoru : 5-22 październik 2015. ilość godzin: 2 NADZORY

Rekonstrukcja fragmentu muru Kurtyny I.

Przedkłada się rysunek częściowej rekonstrukcji muru Kurtyny I z odtworzeniem portalu bramy do poterny.

Zakłada się kontynuację wysokości odbudowy muru kurtyny od muru Bastionu II do ryzalitu bramy poterny. Mur należy nakryć nakrywą betonową na blasze trapezowej – jak opisano w nadzorach z października 2014.

Przypory kamienne po wewnętrznej stronie muru , należy odtworzyć do wysokości korony jedynie na odcinku od istn. muru Bastionu II do bramy poterny. Pozostawione w poziomie terenu będą świadkami konstrukcji budowli. Górną warstwę kamienia należy wypoinować zaprawą z dodatkiem hydrofobu. Całość impregnować hydrofobowo.

Ryzalit bramy poterny należy wznieść na wysokość 47 warstw cegieł ponad cokół – to jest 3 warstwy ponad nadproże bramy. Górną płaszczyznę ryzalitu nakryć nakrywą betonową na blasze trapezowej. Na bokach ryzalitu ukazać formę przekrojową muru – obustronnie licowaną cegłą z kamieniem wapiennym w warstwie wewnętrznej.

W ceglanym portalu bramy osadzić kamienne ościeże.

Odsłonięte boczne ściany poterny zrekonstruować do wysokości muru bramy.


Dalszy ciąg muru Kurtyny I obniżyć – jak pokazano na rysunku.

Kraków, październik 2015 r.



Opracowała:

mgr inż. arch.
Grażyna Szafruga
RP.-Upr.. 201/92
upr. P.S.O.Z. 373/94

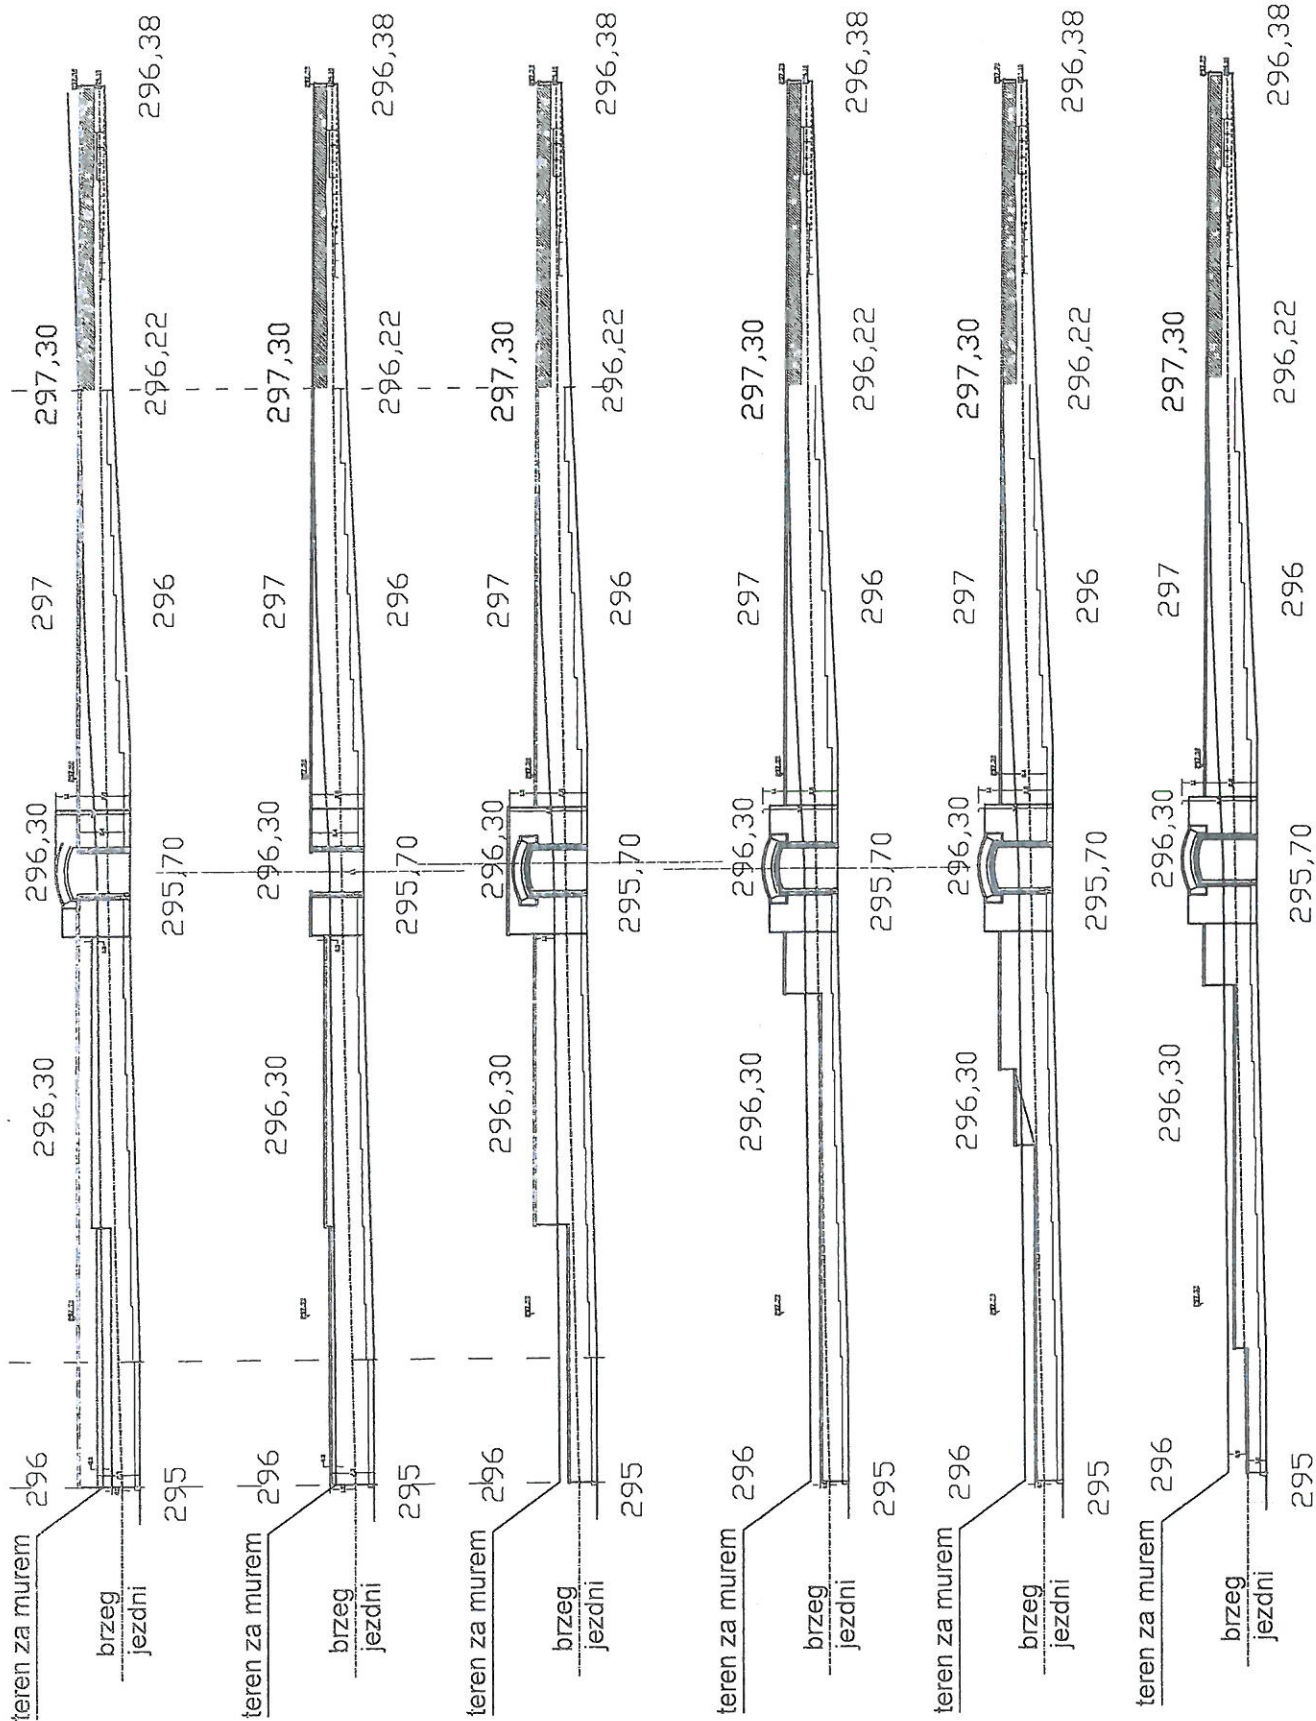

NADZÓR AUTORSKI nr 2/3
 Kutyra I - II
 - wersje robocze na poradę w Biurowie M.K.Z.
 październik 2015 r.

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO nr 3

Inwestor ZBK

Obiekt realizowany i nr zlec.: TT.10-422-38/11/15 (TT.10/10232/15) 33626/TT/VIII/15

FORT 2 KOŚCIUSZKO – KURTYNA II

Wykonujący nadzór : mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

Data wykonanie nadzoru : 23 październik 2015. ilość godzin: 1 NADZÓR

Narada w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie zakresu prac po przedstawieniu rysunków nadzoru autorskiego rekonstrukcji muru Kurtyny I. Uzgodniono wykonanie w całości odcinka od Bastionu II do ryzalitu poterny oraz ryzalit wraz z odworzeniem w cegle portalu i pozostawienia gniazda na kamieniarkę. Pozostałą część muru należy pozostawić na obecnym etapie prac i zabezpieczyć na okres zimowy.

Kraków, 23 październik 2015 r.


 mgr inż. arch.
Grażyna Szafruga
RP.-Upr. 201/92
upr. P.S.O.Z. 373/94

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO nr 4

Inwestor ZBK

Obiekt realizowany i nr zlec.: TT.10-422-38/11/15 (TT.10/10232/15) 33626/TT/VIII/15

FORT 2 KOŚCIUSZKO – KURTYNA II

Wykonujący nadzór : mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

Data wykonanie nadzoru : 16 , 20 Slistopad 2015. ilość godzin: 2 NADZORY

Wykonano inwentaryzację architektoniczną odsłoniętych przy murze Kurtyny II-III na prawo od wejścia do poterny, fragmentów ścian i pozostałości wyposażenia stajni.

W pasie o szer 1- 2 m zostały odsłonięte murki ceglane wys. 70 -130 cm usytuowane prostopadłe do muru kurtyny oraz posadzki betonowe zatarte cementem na gładko. Murki dzielą przestrzeń wzdłuż muru na 3 komory o szerokości: 2,2 m; 6,4 m i 9,9 m.

Na murze kurtyny zachowały się tynki.

W posadzce drugiej komory znajdują się 2 otwory 30 x 30 cm przekryte blachą; na ścianie po lewej stronie, na wys. 1,6 m od posadzki jest ćwierćsferyczna wnęka o szer. 60 cm i wys. 20 cm. Po prawej stronie na wys. 1,3 m od posadzki 2 zdeformowane wsporniki w rozstawie 55 cm, wykonane z teowników 50 x 50 x 5 mm.

W trzeciej komorze znajdują się murowane z cegły żłób i poidło. Fragmentarycznie zachowała się warstwa wykończeniowa z tynku szlachetnego.

Wykonano pomiary odkrytych fundamentów muru wewnętrznego Bastionu I wraz z pozostałościami wejścia do hangaru VIII.

Zachował się mur fundamentowy z wapienia łamanego na wys. ok. 40 cm powyżej poziomu macadamu i ok. 1m poniżej poziomu terenu. Szerokość muru 130 -140 cm.

W miejscu wejścia do hangaru pozostał wtórnie wykonany podest betonowy wykończony lastriko. W podeście utopiona jest kamieniarka bramy. Podest ma szer. 3,75 m i wystaje przed lico mury o 1,1m.

Za murem, 2,2 m na lewo od podestu odsłonięto ok. 2m fragment muru ceglanego usytuowanego prostopadłe do muru z wapienia.

Kraków, listopad 2015 r.




mgr inż. arch.
Grażyna Szafruga
RP.-Upr.. 201/92
upr. P.S.O.Z. 373/94

stojni

poziom terenu

wsporniki stalowe

fragment wnętr poidła

linia brzegu jezdn

złoty

zakres odkrywki

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO nr 5

Inwestor ZBK

Obiekt realizowany i nr zlec.: TT.10-422-38/11/15 (TT.10/10232/15) 33626/TT/VIII/15

FORT 2 KOŚCIUSZKO – KURTYNA II

Wykonujący nadzór : mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

Data wykonanie nadzoru : grudzień 2015. ilość godzin: 2 NADZORY

Przedkłada się rysunki uporządkowania terenu przy Kurtynie I-III.
Zabezpieczenie pozostałości po stajni.

Kraków, grudzień 2015 r.


 mgr inż. arch.
Grażyna Szafruga
RP.-Upr.. 201/92
upr. P.S.O.Z. 373/94

wymiary reliktyw wg inwentaryzacji

naprawa i warstwa

zabezpieczająca

uzupełnienia i naprawa
wyburzenia

obrzeże typu L

profil terenu

profil terenu

profil terenu

NADZÓR AUTORSKI nr 5

Kurtyna II - III

Rekonstrukcja reliktyw stajni
Uporządkowanie otoczenia

grudzień 2015 r.

KIEROWNIK REFERATU
Halina Kojkowska-Tasak

Acceptacja
XII. 2015

J. A S f



KARTA NADZORU AUTORSKIEGO nr 6

Inwestor ZBK

Obiekt realizowany i nr zlec.: TT.10-422-38/11/15 (TT.10/10232/15) 33626/TT/VIII/15

FORT 2 KOŚCIUSZKO – KURTYNA II

Wykonujący nadzór : mgr inż. arch. Grażyna Szafruga

Data wykonanie nadzoru : grudzień 2015. ilość godzin: 2 NADZORY

Przedkładam rysunek rekonstrukcji muru Bastionu I.

Kraków, grudzień 2015 r.



mgr inż. arch.
Grażyna Szafruga
RP.-Upr. 201/92
upr. P.S.O.Z. 373/94

grudzień 2015 r.

